



Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi S.C.M.

P333

CONTRATO MARCO SERVICIOS DE INGENIERÍA

PRC23084

“Servicios EP + Soporte a Terreno Paquete PG210”

Aprobado con Comentarios
Sr. Sergio Cespedes - Collahuasi
Mar 20, 2026, 8:46 AM GMT-3:00

Diccionario AWP

333-PRC23084-000-50-EL-5001

Aprobado con Comentarios
Jose Ceppi - Collahuasi
Mar 23, 2026, 5:42 PM GMT-3:00

26610-225-G27-GCX-50001

Aprobado con Comentarios

Pedro Santibañez - Collahuasi

Rev	Fecha	Propósito de emisión	Por	Rev.	Apr. Sup.	Apr.
Mar 23, 2026, 5:46 PM GMT-3:00						
A	21-jul-25	Coordinación Interna	F.S.V.	P.N.G.	F.L.F.	P.S.D.
B	25-jul-25	Emitido para Aprobación	F.S.V.	P.N.G.	F.L.F.	P.S.D.
0	14-ago-25	Emitido para Información	F.S.V.	P.N.G.	P.S.D.	P.S.D.
1	18-mar-26	Emitido para Información	F.S.V.	M.G.R.	J.C.B	P.S.D.



BECHTEL CHILE LTDA

Aprobado con Comentarios
Gerald Santana - Collahuasi
Mar 20, 2026, 9:02 AM GMT-3:00

**Cuales son los cambios realizados en esta revisión?
Falta un log de modificaciones.**

Aprobado con Comentarios
Misael Rojas - Collahuasi
Mar 24, 2026, 7:46 AM GMT-3:00

Los documentos electrónicos, una vez impresos, se consideran no controlados y pueden estar obsoletos.

Compruebe en Aconex para la revisión actual.

Confidencial. © 2025,2026 Bechtel Chile Ltda. Todos los derechos reservados.

	COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI		VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS		
	Diccionario AWP				
N° CMDIC	FECHA EMISIÓN	REVISIÓN	RESPONSABLES	PÁGINA	N° BECHTEL
333-PRC23084-000-50-EL-5001	18-mar-26	1	Generado: FSV Revisado: MGR Aprobado: PSD	2 de 21	26610-225-G27-GCX-50001

1. INTRODUCCIÓN

Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM (en adelante CMDIC), está realizando un conjunto de estudios denominados “Estudios Complementarios para el Proyecto Crecimiento Ujina”. El Proyecto Crecimiento Ujina tiene como principal objetivo lograr un aumento de capacidad de la Planta Concentradora, a partir de la capacidad media de 170 000 t/d (170 ktpd) obtenida como proyecto 5to Molino de Bolas, llevándola a una capacidad media o throughput de 210 000 t/d (210 ktpd).

2. OBJETIVO

El objetivo del documento es listar y describir la paquetización del proyecto realizada mediante la implementación de la metodología Advanced Work Package (AWP), dividiendo el proyecto en áreas o Construction Work Areas (CWA), volúmenes o Construction Volumes (CV) y paquetes de trabajo o Construction Work Packages (CWP)

3. DEFINICIONES

- AWP (Advanced Work Package): metodología que busca agrupar en “paquetes” de trabajos detallados la construcción, planificación y recursos de un determinado proyecto y/o área.
- CWA (Construction Work Area): área de trabajo definida dentro de la metodología AWP en la cual se divide física y lógicamente el alcance de un proyecto, abarcando distintas disciplinas.
- CV (Construction Volume): volumen de trabajo que permite dividir el área de trabajo en distintos volúmenes multidisciplinarios, corresponden al esfuerzo inicial para identificar los alcances de trabajo ejecutables.
- CWP (Construction Work Package): paquete de trabajo que separa de manera lógica y manejable el volumen de trabajo y que está alineado con el programa de trabajo.
- IWP (Installation Work Package): paquete de instalación generado por el contratista de construcción a partir de los CWP, los cuales buscan separar los recursos y actividades en base a su experiencia de trabajo, alineados con el programa de trabajo.
- SWP (System Work Package): paquete de trabajo que separa por Sistema o Unidades Funcionales de manera lógica y manejable el proceso de la planta, permitiendo el traspaso fluido entre Construcción y PreComisionamiento, como así también entre Comisionamiento y la entrega final a O&M sea de manera ordenada y pensando en la Operación de los Sistemas. Los SWP están alineados con el Programa Maestro de Proyecto (PMS) y con las diferentes Órdenes de Compra.

4. ALCANCE

El presente documento aplica la metodología AWP para Paquete PG210 del Proyecto Crecimiento Ujina, tanto en las áreas de puerto como de cordillera.

	COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI		VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS		
	Diccionario AWP				
N° CMDIC	FECHA EMISIÓN	REVISIÓN	RESPONSABLES	PÁGINA	N° BECHTEL
333-PRC23084-000-50-EL-5001	18-mar-26	1	Generado: FSV Revisado: MGR Aprobado: PSD	3 de 21	26610-225-G27-GCX-50001

5. CODIFICACIÓN CWP'S y SWP'S

Código	Disciplina o Commodity
A	Arquitectura
C	Obras Civiles
D	Hormigones
X	Demoliciones de hormigón
E	Equipos eléctricos
ER	Módulos Sala Eléctrica
EW	Cableado
F	Facilities
FF	Red de incendios
J	Instrumentos
M	Equipos mecánicos
MB	Calderería, mecánica bulk
P	Piping Aboveground
U	Piping Underground
S	Estructura
T	Canalizaciones
SU	Start-up


	COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI		VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS		
	Diccionario AWP				
N° CMDIC	FECHA EMISIÓN	REVISIÓN	RESPONSABLES	PÁGINA	N° BECHTEL
333-PRC23084-000-50-EL-5001	18-mar-26	1	Generado: FSV Revisado: MGR Aprobado: PSD	4 de 21	26610-225-G27-GCX-50001

Construction Work Area (CWA)					
CWA	Nombre				
1157	Repotenciamiento correas overland 115-CV-203, 115-CV-206 y 115-CV-207				




	COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI		VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS		
	Diccionario AWP				
N° CMDIC	FECHA EMISIÓN	REVISIÓN	RESPONSABLES	PÁGINA	N° BECHTEL
333-PRC23084-000-50-EL-5001	18-mar-26	1	Generado: FSV Revisado: MGR Aprobado: PSD	5 de 21	26610-225-G27-GCX-50001

Construction Work Area (CWA)	
CWA	Nombre
1101	Repotenciamiento correa in plant 110-CV-002
1201	Modificaciones estación de transferencia correa 115-CV-203 a correas 110-CV-002 y 120-CV-101; y repotenciamiento correas in plant 120-CV-101 y 120-CV-102
1301	Modificaciones a correas in plant en Stockpile existente, 130-CV-003 y 130-CV-004
1361	Extensión e instalación de nuevos equipos Edificio de Pebbles
1431	Modificación de equipos existentes en Edificio de Pebbles y extensión sala eléctrica 143-ER-001
1401	Alimentación agua de procesos Molienda
1601	Modificaciones planta de cal existente
1631	Bombas de distribución de Reactivos
5301	Reservorio agua fresca

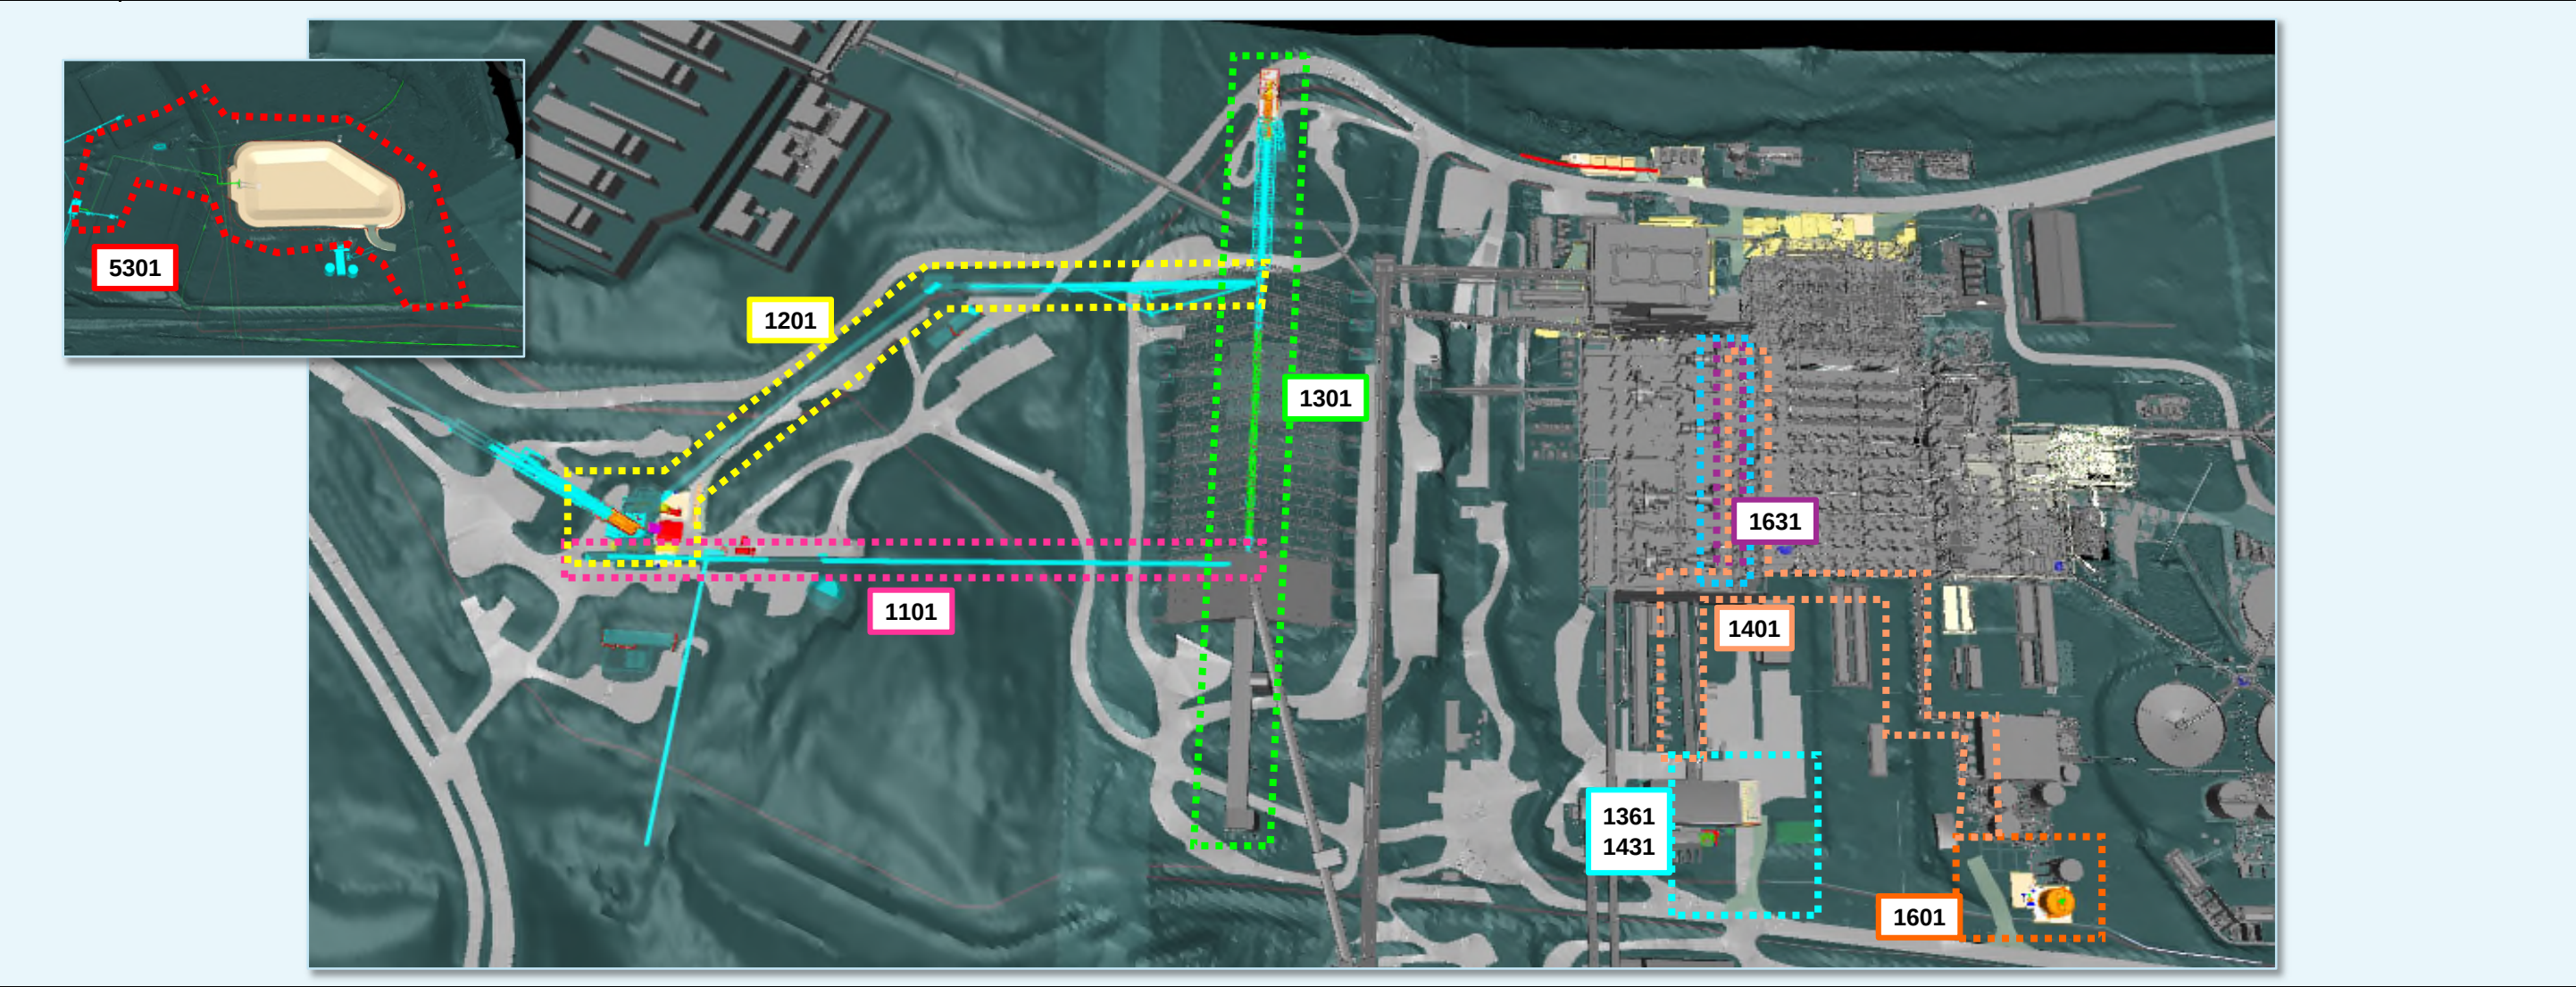

	COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI		VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS		
	Diccionario AWP				
N° CMDIC	FECHA EMISIÓN	REVISIÓN	RESPONSABLES	PÁGINA	N° BECHTEL
333-PRC23084-000-50-EL-5001	18-mar-26	1	Generado: FSV Revisado: MGR Aprobado: PSD	6 de 21	26610-225-G27-GCX-50001

Construction Work Area (CWA)	
CWA	Nombre
3121	Espesador de concentrado colectivo Cu-Molibdeno
3221	Extensión stockpile
7101	Sala eléctrica 710-ER-001
7201	Estanques de acondicionado y acidulado

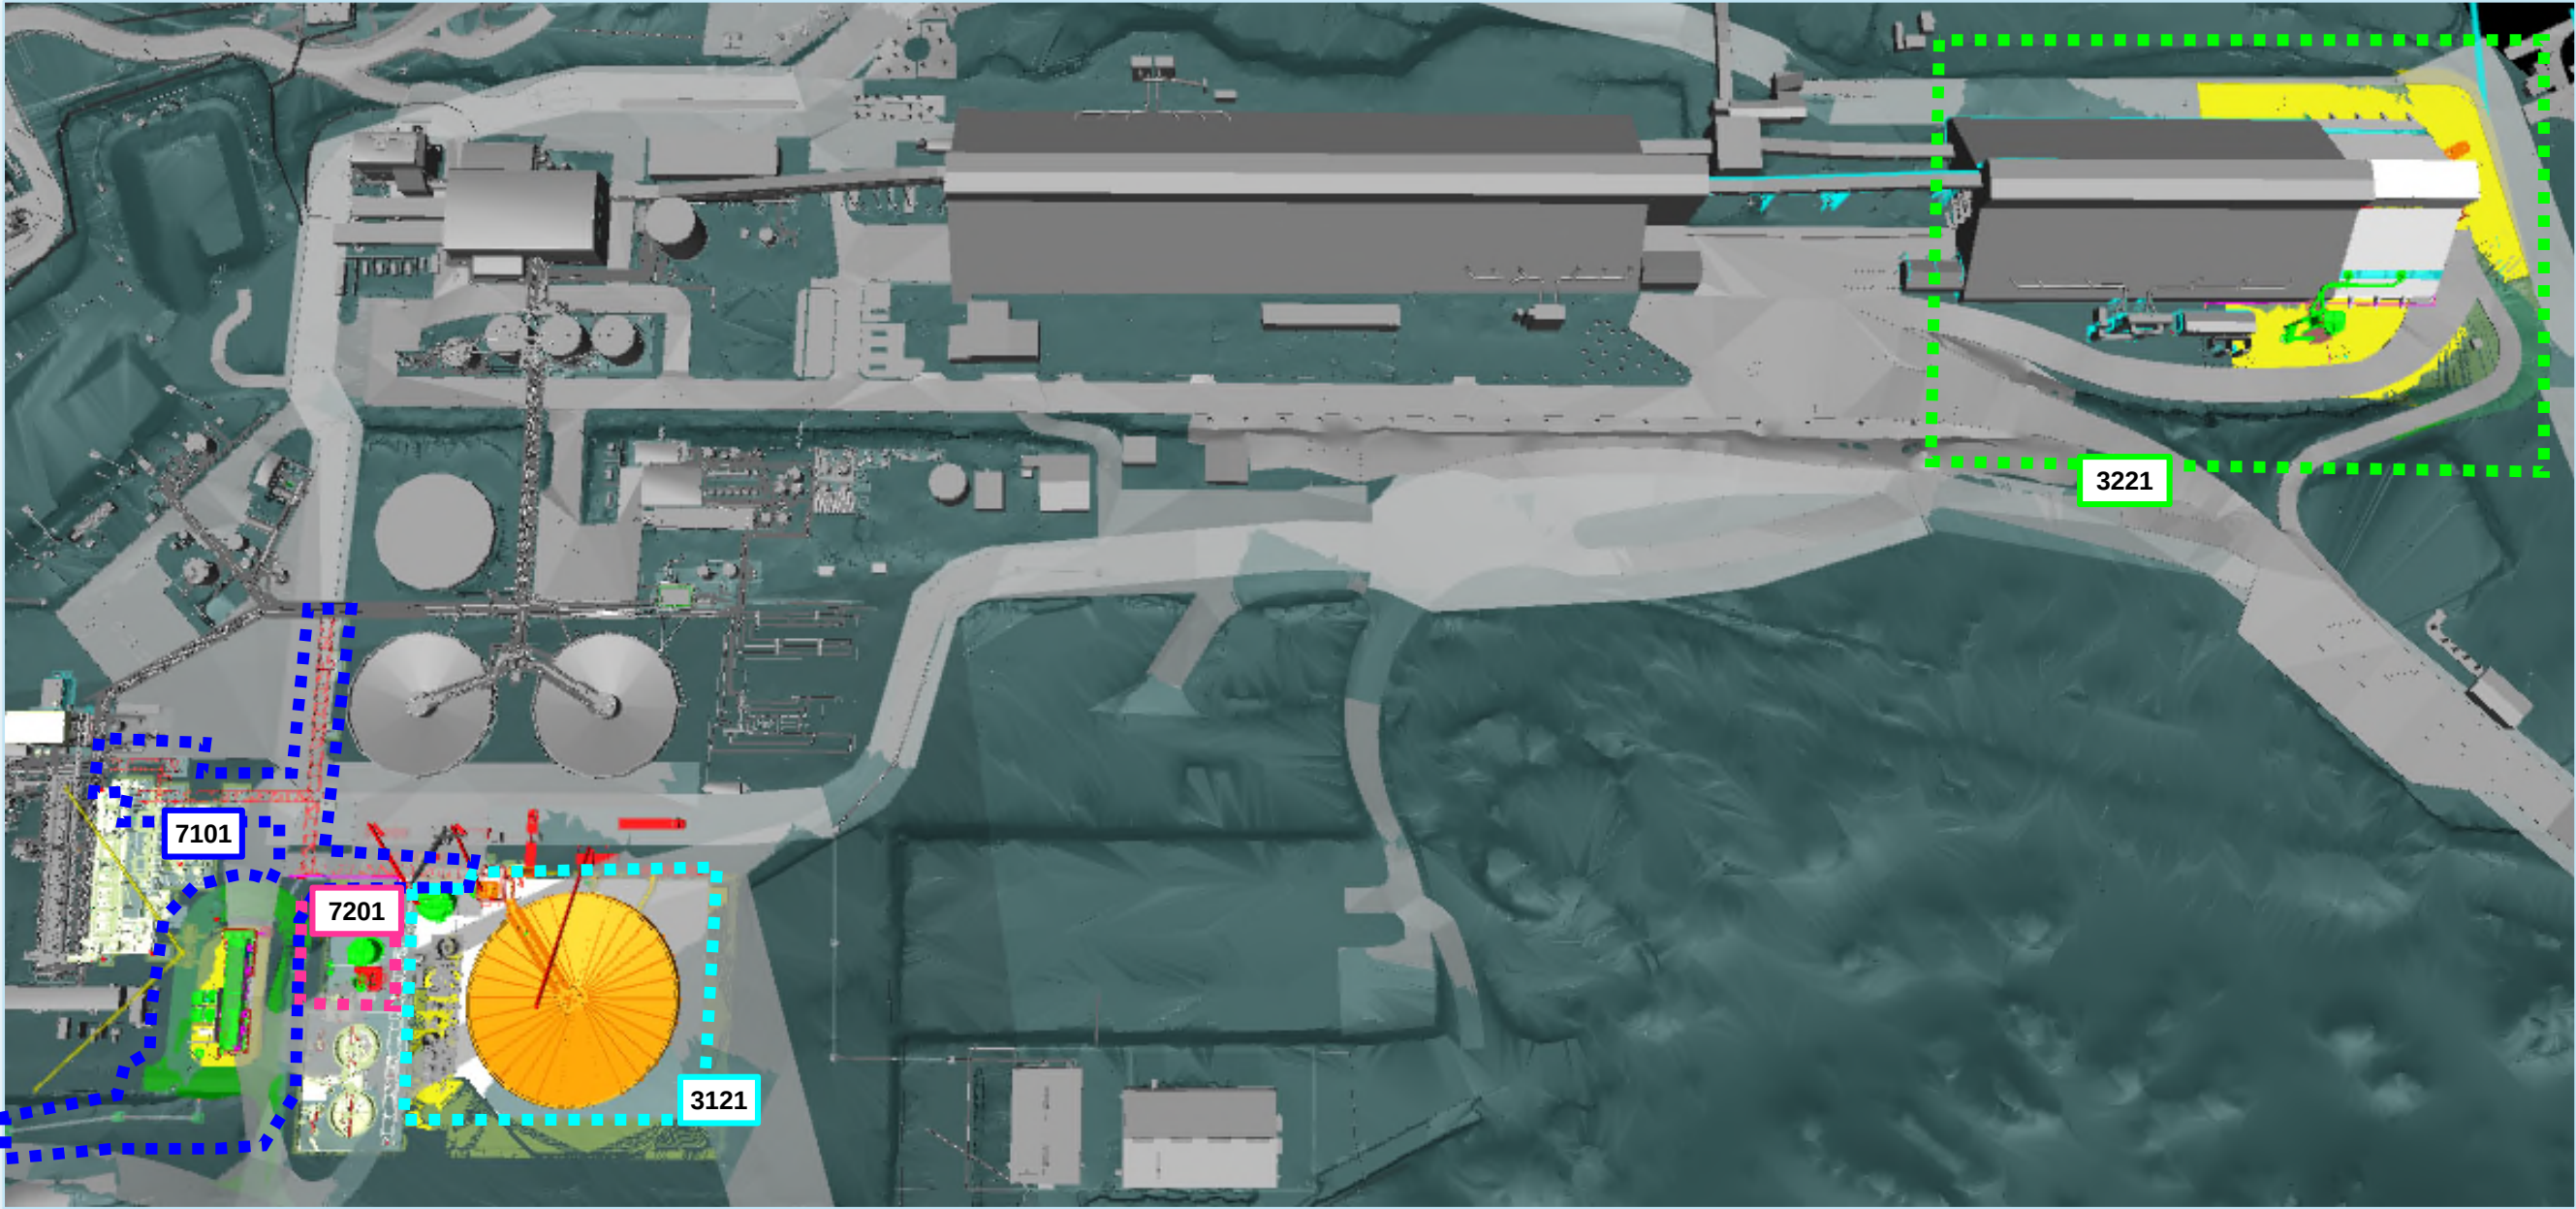

					COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI		VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS					
					Diccionario AWP							
N° CMDIC					FECHA EMISIÓN		REVISIÓN	RESPONSABLES		PÁGINA	N° BECHTEL	
333-PRC23084-000-50-EL-5001					18-mar-26		1	Generado: FSV Revisado: MGR Aprobado: PSD		7 de 21	26610-225-G27-GCX-50001	
Construction Volumes (CV)												
CWA	Correlativo	Volumen	CV	Nombre CV								
1157	0	1	115701	Correa 115-CV-203								
1157	0	2	115702	Correa 115-CV-206								
1157	0	3	115703	Correa 115-CV-207								
1101	0	1	110101	Correa 110-CV-002								
1201	0	1	120101	Estación de transferencia 120-BIN-001								
1201	0	2	120102	Correa 120-CV-101								
1201	0	3	120103	Correa 120-CV-102								
1301	0	1	130101	Correa 130-CV-004								
1301	0	2	130102	Correa 130-CV-003								
1361	0	1	136101	Edificio de Pebbles - Nuevo								
1401	0	1	140101	Alimentación agua de procesos hacia Edificio de Pebbles y nuevas instalaciones de cal								
1431	0	1	143101	Extensión Edificio de Pebbles y Sala eléctrica 143-ER-001								
1601	0	1	160101	Modificaciones planta de cal existente								
1631	0	1	163101	Bombas de distribución de reactivos								
5301	0	1	530101	Reservorio para agua fresca planta Ujina								
3121	0	1	312101	Espesador concentrado 312-TK-2005								
3221	0	1	322101	Extensión Stockpile								
7101	0	1	710101	Sala eléctrica 700-ER-705								
7101	0	2	710102	Integración al sistema de Control Edificio Persenk								
7101	0	3	710103	Estanque de reprocesamiento de colas 710-TK-2016								
7101	0	4	710104	Piperacks								
7201	0	1	720101	Estanques de acidulado y acondicionado								

Se deben adjuntar editables en excel de las tablas que conforman este documento de manera de facilitar su revisión y uso.

					COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI					VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS			
					Diccionario AWP								
N° CMDIC					FECHA EMISIÓN		REVISIÓN			RESPONSABLES		PÁGINA	N° BECHTEL
333-PRC23084-000-50-EL-5001					18-mar-26		1			Generado: FSV Revisado: MGR Aprobado: PSD		8 de 21	26610-225-G27-GCX-50001
Construction Work Packages (CWP)													
Contrato	CWA	Correlativo CV	CV_V	CV	Separador	Disciplina	Correlativo CWP 1	Correlativo CWP 2	CWP	EWP	Nombre CWP / EWP	Descripción de alcance, elementos y equipos del CWP / EWP	
Correas Overland	1157	0	1	115701	.	C	00	1	115701.C001	115701.C001E	Obras Civiles Correa 115-CV-203	Excavaciones y rellenos para reforzamientos estructurales de correa 115-CV-203 y para canalizaciones por cambio del sistema motriz.	
Correas Overland	1157	0	1	115701	.	D	00	1	115701.D001	115701.D001E	Hormigones Correa 115-CV-203	Hormigones para reforzamientos estructurales de correa 115-CV-203 y para canalizaciones por cambio del sistema motriz.	
Correas Overland	1157	0	1	115701	.	S	00	1	115701.S001	115701.S001E	Estructura Correa 115-CV-203	Estructura de reforzamiento Correa 115-CV-203.	
Correas Overland	1157	0	1	115701	.	EW	00	1	115701.EW001	115701.EW001E	Cableado Correa 115-CV-203	Cableado eléctrico e instrumentación por cambio de sistema motriz correa 115-CV-203.	
Correas Overland	1157	0	1	115701	.	T	00	1	115701.T001	115701.T001E	Canalizaciones Correa 115-CV-203	Canalizaciones para cableado por cambio de sistema motriz correa 115-CV-203.	
Correas Overland	1157	0	1	115701	.	J	00	1	115701.J001	115701.J001E	Instrumentos Correa 115-CV-203	Gabinetes, cabeceras, switchs acceso, sensores de corte, atollo, vibración, temperatura u otros instrumentos asociados al funcionamiento de la correa 115-CV-203.	
Correas Overland	1157	0	1	115701	.	M	00	1	115701.M001	115701.M001E	Equipos mecánicos Correa 115-CV-203	Sistema freno, acoplamientos, motores, reductores u otros equipos mecánicos de la Correa 115-CV-203.	
Correas Overland	1157	0	1	115701	.	MB	00	1	115701.MB001	115701.MB001E	Calderería Correa 115-CV-203	Chutes asociados a correa 115-CV-203.	
Correas Overland	1157	0	1	115701	.	E	00	1	115701.E001	115701.E001E	Equipos eléctricos correa 115-CV-203	Instalación VDF u otros equipos eléctricos correa 115-CV-203.	
Correas Overland	1157	0	2	115702	.	C	00	1	115702.C001	115702.C001E	Obras Civiles Correa 115-CV-206	Excavaciones y rellenos para reforzamientos estructurales de correa 115-CV-206 y para canalizaciones por cambio del sistema motriz.	
Correas Overland	1157	0	2	115702	.	D	00	1	115702.D001	115702.D001E	Hormigones Correa 115-CV-206	Hormigones para reforzamientos estructurales de correa 115-CV-206 y para canalizaciones por cambio del sistema motriz.	
Correas Overland	1157	0	2	115702	.	S	00	1	115702.S001	115702.S001E	Estructura 115-CV-206	Estructura de reforzamiento Correa 115-CV-206.	
Correas Overland	1157	0	2	115702	.	EW	00	1	115702.EW001	115702.EW001E	Cableado Correa 115-CV-206	Cableado eléctrico e instrumentación por cambio de sistema motriz correa 115-CV-206.	
Correas Overland	1157	0	2	115702	.	T	00	1	115702.T001	115702.T001E	Canalizaciones Correa 115-CV-206	Canalizaciones para cableado por cambio de sistema motriz correa 115-CV-206.	
Correas Overland	1157	0	2	115702	.	J	00	1	115702.J001	115702.J001E	Instrumentos Correa 115-CV-206	Gabinetes, cabeceras, switchs acceso, sensores de corte, atollo, vibración, temperatura u otros instrumentos asociados al funcionamiento de la correa 115-CV-206.	
Correas Overland	1157	0	2	115702	.	M	00	1	115702.M001	115702.M001E	Equipos mecánicos Correa 115-CV-206	Sistema freno, acoplamientos, motores, reductores u otros equipos mecánicos de la Correa 115-CV-206.	
Correas Overland	1157	0	2	115702	.	MB	00	1	115702.MB001	115702.MB001E	Calderería Correa 115-CV-206	Chutes asociados a correa 115-CV-206.	
Correas Overland	1157	0	2	115702	.	E	00	1	115702.E001	115702.E001E	Equipos eléctricos correa 115-CV-206	Instalación VDF u otros equipos eléctricos correa 115-CV-206.	
Correas Overland	1157	0	3	115703	.	C	00	1	115703.C001	115703.C001E	Obras Civiles Correa 115-CV-207	Excavaciones y rellenos para reforzamientos estructurales de correa 115-CV-207 y para canalizaciones por modificaciones del sistema motriz.	
Correas Overland	1157	0	3	115703	.	D	00	1	115703.D001	115703.D001E	Hormigones Correa 115-CV-207	Hormigones para reforzamientos estructurales de correa 115-CV-207 y para canalizaciones por modificaciones del sistema motriz.	
Correas Overland	1157	0	3	115703	.	S	00	1	115703.S001	115703.S001E	Estructura Correa 115-CV-207	Estructura de reforzamiento Correa 115-CV-207.	
Correas Overland	1157	0	3	115703	.	EW	00	1	115703.EW001	115703.EW001E	Cableado Correa 115-CV-207	Cableado eléctrico e instrumentación por modificaciones de sistema motriz correa 115-CV-207.	

					COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI					VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS				
					Diccionario AWP									
N° CMDIC					FECHA EMISIÓN		REVISIÓN			RESPONSABLES		PÁGINA	N° BECHTEL	
333-PRC23084-000-50-EL-5001					18-mar-26		1			Generado: FSV Revisado: MGR Aprobado: PSD		9 de 21	26610-225-G27-GCX-50001	
Construction Work Packages (CWP)														
Contrato	CWA	Correlativo CV	CV_V	CV	Separador	Disciplina	Correlativo CWP 1	Correlativo CWP 2	CWP	EWP	Nombre CWP / EWP	Descripción de alcance, elementos y equipos del CWP / EWP		
Correas Overland	1157	0	3	115703	.	T	00	1	115703.T001	115703.T001E	Canalizaciones Correa 115-CV-207	Canalizaciones para cableado por modificaciones al sistema motriz correa 115-CV-207.		
Correas Overland	1157	0	3	115703	.	J	00	1	115703.J001	115703.J001E	Instrumentos Correa 115-CV-207	Gabinetes, cabeceras, switchs acceso, sensores de corte, atollo, vibración, temperatura u otros instrumentos asociados al funcionamiento de la correa 115-CV-207.		
Correas Overland	1157	0	3	115703	.	M	00	1	115703.M001	115703.M001E	Equipos mecánicos Correa 115-CV-207	Sistema freno, acoplamientos, motores, reductores u otros equipos mecánicos de la Correa 115-CV-207.		
Correas Overland	1157	0	3	115703	.	MB	00	1	115703.MB001	115703.MB001E	Calderería Correa 115-CV-207	Chutes asociados a correa 115-CV-207.		
Correas Overland	1157	0	3	115703	.	E	00	1	115703.E001	115703.E001E	Equipos eléctricos correa 115-CV-207	Instalación VDF, sistema SCADA u otros equipos eléctricos correa 115-CV-207.		
Cordillera	1201	0	1	120101	.	C	00	1	120101.C001	120101.C001E	Obras Civiles estación de transferencia correa 115-CV-203 a correas 120-CV-101 y 110-CV-002	Excavaciones y rellenos para búnker acopio de emergencia en BIN.		
Cordillera	1201	0	1	120101	.	D	00	1	120101.D001	120101.D001E	Hormigones estación de transferencia correa 115-CV-203 a correas 120-CV-101 y 110-CV-002	Hormigones para búnker acopio de emergencia en BIN.		
Cordillera	1201	0	1	120101	.	S	00	1	120101.S001	120101.S001E	Estructura estación de transferencia correa 115-CV-203 a correas 120-CV-101 y 110-CV-002	Estructura de soporte para chute de rebose BIN 120-ST-7030 y nueva plataforma de acceso a BIN.		
Cordillera	1201	0	1	120101	.	MB	00	1	120101.MB001	120101.MB001E	Calderería estación de transferencia correa 115-CV-203 a correas 120-CV-101 y 110-CV-002	Chute rebose BIN (120-ST-7030).		
Cordillera	1201	0	2	120102	.	S	00	1	120102.S001	120102.S001E	Estructura correa 120-CV-101	Estructura de refuerzo por modificación sistema motriz correa 120-CV-101.		
Cordillera	1201	0	2	120102	.	M	00	1	120102.M001	120102.M001E	Equipos mecánicos correa 120-CV-101	Motores, reductores, poleas, acoples u otros equipos mecánicos correa 120-CV-101.		
Cordillera	1201	0	2	120102	.	E	00	1	120102.E001	120102.E001E	Equipos eléctricos correa 120-CV-101	Instalación VDF, sistema SCADA u otros equipos eléctricos correa 120-CV-201.		
Cordillera	1201	0	2	120102	.	EW	00	1	120102.EW001	120102.EW001E	Cableado correa 120-CV-101	Cableado eléctrico e instrumentación por modificación sistema motriz correa 120-CV-101.		
Cordillera	1201	0	2	120102	.	T	00	1	120102.T001	120102.T001E	Canalizaciones correa 120-CV-101	Canalizaciones para cableado por modificaciones al sistema motriz correa 120-CV-101.		
Cordillera	1201	0	2	120102	.	J	00	1	120102.J001	120102.J001E	Instrumentos correa 120-CV-101	Gabinetes de comunicación, instrumentos sistema de control, sistema de monitoreo de condiciones u otros instrumentos correa 120-CV-101.		
Cordillera	1201	0	2	120102	.	F	00	1	120102.F001	120102.F001E	Malla a tierra y pararrayos correa 120-CV-101	Construcción y/o conexión a malla puesta tierra existente 120-CV-101.		
Cordillera	1201	0	2	120102	.	F	00	2	120102.F002	120102.F002E	Alumbrado correa 120-CV-101	Instalación de luminaria correa 120-CV-101.		
Cordillera	1201	0	3	120103	.	C	00	1	120103.C001	120103.C001E	Obras Civiles correa 120-CV-102	Excavaciones y rellenos para modificaciones en correa 120-CV-102.		
Cordillera	1201	0	3	120103	.	D	00	1	120103.D001	120103.D001E	Hormigones correa 120-CV-102	Hormigones para fundaciones por reforzamiento de estructuras debido a modificaciones de sistema motriz		
Cordillera	1201	0	3	120103	.	M	00	1	120103.M001	120103.M001E	Equipos mecánicos correa 120-CV-102	Motor, reductor, polea, acople u otros equipos mecánicos correa 120-CV-102.		
Cordillera	1201	0	3	120103	.	E	00	1	120103.E001	120103.E001E	Equipos eléctricos correa 120-CV-102	Instalación VDF, sistema SCADA u otros equipos eléctricos correa 120-CV-201.		
Cordillera	1201	0	3	120103	.	EW	00	1	120103.EW001	120103.EW001E	Cableado correas correa 120-CV-102	Cableado eléctrico e instrumentación por modificación sistema motriz correa 120-CV-102.		

					COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI					VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS				
					Diccionario AWP									
N° CMDIC					FECHA EMISIÓN		REVISIÓN			RESPONSABLES		PÁGINA	N° BECHTEL	
333-PRC23084-000-50-EL-5001					18-mar-26		1			Generado: FSV Revisado: MGR Aprobado: PSD		10 de 21	26610-225-G27-GCX-50001	
Construction Work Packages (CWP)														
Contrato	CWA	Correlativo CV	CV_V	CV	Separador	Disciplina	Correlativo CWP 1	Correlativo CWP 2	CWP	EWP	Nombre CWP / EWP	Descripción de alcance, elementos y equipos del CWP / EWP		
Cordillera	1201	0	3	120103	.	T	00	1	120103.T001	120103.T001E	Canalizaciones correas correa 120-CV-102	Canalizaciones para cableado por modificaciones al sistema motriz correa 120-CV-102.		
Cordillera	1201	0	3	120103	.	J	00	1	120103.J001	120103.J001E	Instrumentos correas correa 120-CV-102	Gabinets de comunicación, sistema de control, sistema de monitoreo de condiciones u otros instrumentos correa 120-CV-101.		
Cordillera	1201	0	3	120103	.	F	00	1	120103.F001	120103.F001E	Malla a tierra y pararrayos correas correa 120-CV-102	Construcción y/o conexión a malla puesta tierra existente correa 120-CV-102.		
Cordillera	1201	0	3	120103	.	F	00	2	120103.F002	120103.F002E	Alumbrado correa 120-CV-102	Instalación de luminaria correa 120-CV-102.		
Cordillera	1201	0	3	120103	.	MB	00	2	120103.MB002	120103.MB002E	Calderería correas 120-CV-101 y 120-CV-102	Chutes de alimentación y descarga correas 120-CV-101 y 120-CV-102.		
Cordillera	1101	0	1	110101	.	C	00	1	110101.C001	110101.C001E	Obras Civiles correa 110-CV-002	Excavaciones y rellenos para cambio de sistema motriz.		
Cordillera	1101	0	1	110101	.	D	00	1	110101.D001	110101.D001E	Hormigones correa 110-CV-002	Hormigones para fundaciones por reforzamiento de estructuras debido a modificaciones de sistema motriz correa 110-CV-002.		
Cordillera	1101	0	1	110101	.	S	00	1	110101.S001	110101.S001E	Estructura correa 110-CV-002	Estructura de refuerzo por reemplazo polea correa 110-CV-002.		
Cordillera	1101	0	1	110101	.	M	00	1	110101.M001	110101.M001E	Equipos mecánicos correa 110-CV-002	Motor, reductor, polea, backstop u otros equipos mecánicos correa 110-CV-002.		
Cordillera	1101	0	1	110101	.	E	00	1	110101.E001	110101.E001E	Equipos eléctricos correa 110-CV-002	Instalación VDF, sistema SCADA u otros equipos eléctricos correa 110-CV-002.		
Cordillera	1101	0	1	110101	.	J	00	1	110101.J001	110101.J001E	Instrumentos correa 110-CV-002	Instrumentos correa 110-CV-002.		
Cordillera	1101	0	1	110101	.	MB	00	1	110101.MB001	110101.MB001E	Calderería correa 110-CV-002	Chutes de alimentación y descarga correa 110-CV-002.		
Cordillera	1101	0	1	110101	.	EW	00	1	110101.EW001	110101.EW001E	Cableado correa 110-CV-002	Cableado eléctrico e instrumentación por modificación sistema motriz correa 110-CV-002.		
Cordillera	1101	0	1	110101	.	T	00	1	110101.T001	110101.T001E	Canalizaciones correa 110-CV-002	Canalizaciones para cableado por modificaciones al sistema motriz correa 110-CV-002.		
Cordillera	1101	0	1	110101	.	F	00	1	110101.F001	110101.F001E	Malla a tierra y pararrayos correa 110-CV-002	Construcción y/o conexión a malla puesta tierra existente correa 110-CV-002.		
Cordillera	1101	0	1	110101	.	F	00	2	110101.F002	110101.F002E	Alumbrado correa 110-CV-002	Instalación de luminaria correa 110-CV-002.		
Cordillera	1301	0	1	130101	.	C	00	1	130101.C001	130101.C001E	Obras Civiles correa 130-CV-004	Excavaciones y rellenos para fundaciones de extensión de correa 130-CV-004.		
Cordillera	1301	0	1	130101	.	D	00	1	130101.D001	130101.D001E	Hormigones correa 130-CV-004	Hormigón para fundaciones de extensión galería de correa 130-CV-004.		
Cordillera	1301	0	1	130101	.	S	00	1	130101.S001	130101.S001E	Estructura correa 130-CV-004	Montaje de estructura para extensión de correa 130-CV-004 y desmontaje para tie-in con estructura existente.		
Cordillera	1301	0	1	130101	.	A	00	1	130101.A001	130101.A001E	Arquitectura extensión correa 130-CV-004	Instalación y retiro de revestimiento extensión de correa 130-CV-004.		
Cordillera	1301	0	1	130101	.	M	00	1	130101.M001	130101.M001E	Equipos mecánicos correa 130-CV-004	Cinta, polines, festoon u otros equipos mecánicos correa 130-CV-004.		
Cordillera	1301	0	1	130101	.	J	00	1	130101.J001	130101.J001E	Instrumentos correa 130-CV-004	Pullcord, sensores u otros instrumentos correa 130-CV-004.		
Cordillera	1301	0	1	130101	.	E	00	1	130101.E001	130101.E001E	Equipos eléctricos correa 130-CV-004	Equipos eléctricos correa 130-CV-004.		

					COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI					VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS						
					Diccionario AWP											
N° CMDIC					FECHA EMISIÓN		REVISIÓN			RESPONSABLES			PÁGINA		N° BECHTEL	
333-PRC23084-000-50-EL-5001					18-mar-26		1			Generado: FSV Revisado: MGR Aprobado: PSD			11 de 21		26610-225-G27-GCX-50001	
Construction Work Packages (CWP)																
Contrato	CWA	Correlativo CV	CV_V	CV	Separador	Disciplina	Correlativo CWP 1	Correlativo CWP 2	CWP	EWP	Nombre CWP / EWP			Descripción de alcance, elementos y equipos del CWP / EWP		
Cordillera	1301	0	1	130101	.	EW	00	1	130101.EW001	130101.EW001E	Cableado correa 130-CV-004			Cableado eléctrico e instrumentación correa 130-CV-004.		
Cordillera	1301	0	1	130101	.	T	00	1	130101.T001	130101.T001E	Canalizaciones correa 130-CV-004			Canalizaciones correa 130-CV-004.		
Cordillera	1301	0	1	130101	.	F	00	1	130101.F001	130101.F001E	Malla a tierra y pararrayos correa 130-CV-004			Malla a tierra y pararrayos correa 130-CV-004.		
Cordillera	1301	0	1	130101	.	F	00	2	130101.F002	130101.F002E	Alumbrado correa 130-CV-004			Instalación de luminaria correa 130-CV-004.		
Cordillera	1301	0	1	130101	.	FF	00	1	130101.FF001	130101.FF001E	Red de incendios correa 130-CV-004			Red de incendios Aboveground y Underground correa 130-CV-004.		
Cordillera	1301	0	1	130101	.	P	00	1	130101.P001	130101.P001E	Piping correa 130-CV-004			Líneas de Aire instrumentación correa 130-CV-004.		
Cordillera	1301	0	2	130102	.	M	00	1	130102.M001	130102.M001E	Equipos mecánicos correa 130-CV-003			Poleas u otros equipos eléctricos correa 130-CV-003.		
Cordillera	1301	0	2	130102	.	J	00	1	130102.J001	130102.J001E	Instrumentos correa 130-CV-003			Pullcord, sensores u otros instrumentos correa 130-CV-003.		
Cordillera	1301	0	2	130102	.	EW	00	1	130102.EW001	130102.EW001E	Cableado correa 130-CV-003			Cableado eléctrico e instrumentación de correa 130-CV-003.		
Cordillera	1301	0	2	130102	.	E	00	1	130102.E001	130102.E001E	Equipos eléctricos correa 130-CV-003			Equipos eléctricos correa 130-CV-003.		
Cordillera	1301	0	2	130102	.	T	00	1	130102.T001	130102.T001E	Canalizaciones correa 130-CV-003			Canalizaciones correa 130-CV-003.		
Cordillera	1431	0	1	143101	.	C	00	1	143101.C001	143101.C001E	Obras Civiles Edificio de Harneado de Pebbles			Movimientos de tierra para extensión del edificio de Pebbles, extensión de sala eléctrica 143-ER-001, bancoducto y camino.		
Cordillera	1431	0	1	143101	.	D	00	1	143101.D001	143101.D001E	Hormigones Edificio de Harneado de Pebbles			Hormigones para extensión Edificio de Pebbles, extensión Sala Eléctrica 143-ER-001 y bancoducto.		
Cordillera	1431	0	1	143101	.	X	00	1	143101.X001	143101.X001E	Demoliciones de hormigón Edificio de Harneado de Pebbles			Demoliciones de hormigón.		
Cordillera	1431	0	1	143101	.	S	00	1	143101.S001	143101.S001E	Estructura Edificio de Harneado de Pebbles			Instalación y desmantelamiento de estructuras de acero para extensión del Edificio de Pebbles. Incluye soportes de cañerías >3".		
Cordillera	1431	0	1	143101	.	A	00	1	143101.A001	143101.A001E	Arquitectura Edificio de Pebbles			Instalación y retiro de revestimiento para extensión del Edificio de Pebbles.		
Cordillera	1361	0	1	136101	.	M	00	1	136101.M001	136101.M001E	Equipos mecánicos nuevos Edificio de Pebbles			Harnero 136-SC-3001, correa 136-CV-3010, bombas cajón recolector harnero 136-PP-3050/3051, alimentadores rotatorios 136-FE-3021/3022/3023, unidad hidráulica 136-HU-3001.		
Cordillera	1361	0	1	136101	.	MB	00	1	136101.MB001	136101.MB001E	Calderería Edificio de Pebbles			Chute alimentación nuevo harnero 136-ST-3007, Chute sobretamaño harnero 136-ST-3005, chute bajo tamaño harnero 136-ST-3006, cajón recolector bajo tamaño 136-ST-3035, chute alimentación correa 136-CV-3010 (136-ST-3010), chute descarga correa 136-CV-3010 (136-ST-3011), cajón distribuidor Pebbles 136-ST-3012, y chutes de alimentación del harnero 136-ST-3013/3014.		
Cordillera	1361	0	1	136101	.	P	00	1	136101.P001	136101.P001E	Piping Edificio de Pebbles			Cañerías Aboveground para aire, agua y pulpa.		
Cordillera	1361	0	1	136101	.	E	00	1	136101.E001	136101.E001E	Equipos eléctricos Edificio de Pebbles			Variadores de frecuencia, paneles, gabinetes u otros equipos eléctricos Edificio de Pebbles.		
Cordillera	1361	0	1	136101	.	EW	00	1	136101.EW001	136101.EW001E	Cableado Edificio de Pebbles			Cableado eléctrico e instrumentación Edificio de Pebbles.		

					COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI				VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS				
					Diccionario AWP								
N° CMDIC					FECHA EMISIÓN		REVISIÓN			RESPONSABLES		PÁGINA	N° BECHTEL
333-PRC23084-000-50-EL-5001					18-mar-26		1			Generado: FSV Revisado: MGR Aprobado: PSD		12 de 21	26610-225-G27-GCX-50001
Construction Work Packages (CWP)													
Contrato	CWA	Correlativo CV	CV_V	CV	Separador	Disciplina	Correlativo CWP 1	Correlativo CWP 2	CWP	EWP	Nombre CWP / EWP	Descripción de alcance, elementos y equipos del CWP / EWP	
Cordillera	1361	0	1	136101	.	T	00	1	136101.T001	136101.T001E	Canalizaciones Edificio de Pebbles	Canalizaciones Edificio de Pebbles.	
Cordillera	1361	0	1	136101	.	J	00	1	136101.J001	136101.J001E	Instrumentos Edificio de Pebbles	Válvulas y sensores de flujo, transmisores e indicadores de presión u otros instrumentos Edificio de Pebbles.	
Cordillera	1361	0	1	136101	.	F	00	1	136101.F001	136101.F001E	Malla a tierra y pararrayos extensión Edificio de Pebbles y Sala Eléctrica 143-ER-001	Construcción y/o conexión a malla puesta tierra existentes extensión Edificio de Pebbles y Sala Eléctrica 143-ER-001. Incluye instalación de pararrayos.	
Cordillera	1361	0	1	136101	.	F	00	2	136101.F002	136101.F002E	Alumbrado extensión Edificio de Pebbles y Sala Eléctrica 143-ER-001	Instalación de luminarias y postes de alumbrado en extensión de Edificio de Pebbles y Sala Eléctrica 143-ER-001.	
Cordillera	1361	0	1	136101	.	FF	00	1	136101.FF001	136101.FF001E	Red de incendios Edificio de Pebbles	Red de incendios extensión Aboveground y Underground Edificio de Pebbles y Sala Eléctrica 143-ER-001.	
Cordillera	1431	0	1	143101	.	M	00	1	143101.M001	143101.M001E	Equipos mecánicos extensión correa 143-CV-2406 y puente grúa 143-CN-2401	Extensión correa 143-CV-2406, tecles mantención bombas 143-CH-3041/3042/3043/3044, extensión puente grúa 143-CN-2401.	
Cordillera	1431	0	1	143101	.	ER	00	1	143101.ER001	143101.ER001E	Módulo de extensión de sala eléctrica 143-ER-001	Instalación de módulos para extensión de sala eléctrica 143-ER-001.	
Cordillera	1401	0	1	140101	.	P	00	1	140101.P001	140101.P001E	Piping Molienda	Líneas de descarga del Edificio Harnero de Pebbles proyectado a líneas 1, 2 y 3 de molienda.	
Cordillera	1401	0	1	140101	.	S	00	1	140101.S001	140101.S001E	Estructura de soporte piping Molienda	Estructuras de soporte para líneas de descarga >3" del Edificio Harnero de Pebbles proyectado a líneas 1, 2 y 3 de molienda.	
Cordillera	1401	0	1	140101	.	J	00	1	140101.J001	140101.J001E	Instrumentos Molienda	Instrumentos de medición y control para líneas de descarga del Edificio Harnero de Pebbles proyectado a líneas 1, 2 y 3 de molienda.	
Cordillera	1401	0	1	140101	.	EW	00	1	140101.EW001	140101.EW001E	Cableado Molienda	Cableado para instrumentos de medición y control para líneas de descarga del Edificio Harnero de Pebbles proyectado a líneas 1, 2 y 3 de molienda.	
Cordillera	1401	0	1	140101	.	T	00	1	140101.T001	140101.T001E	Canalizaciones Molienda	Canalizaciones para instrumentos de medición y control para líneas de descarga del Edificio Harnero de Pebbles proyectado a líneas 1, 2 y 3 de molienda.	
Cordillera	1401	0	1	140101	.	D	00	1	140101.D001	140101.D001E	Hormigones Molienda	Hormigón y demoliciones de hormigón para fundaciones de soporte líneas de descarga del Edificio Harnero de Pebbles proyectado a líneas 1, 2 y 3 de molienda.	
Cordillera	1601	0	1	160101	.	C	00	1	160101.C001	160101.C001E	Obras Civiles nuevas instalaciones en Planta de Cal	Movimientos de tierra asociados a caminos, excavaciones masivas y estructurales para nuevas instalaciones en Cal.	
Cordillera	1601	0	1	160101	.	D	00	1	160101.D001	160101.D001E	Hormigones nuevas instalaciones en Planta de Cal	Hormigón para fundaciones estanque 160-TK-7110 y bombas de impulsión de lechada de cal y de sumidero. Incluye demolición.	
Cordillera	1601	0	1	160101	.	S	00	1	160101.S001	160101.S001E	Estructura nuevas instalaciones en Planta de Cal	Estructuras para plataformas de acceso a estanque y a bombas de impulsión y otras estructuras para nuevo estanque de Cal. Incluye soportes de cañerías >3".	
Cordillera	1601	0	1	160101	.	MB	00	1	160101.MB001	160101.MB001E	Calderería nuevas instalaciones en Planta de Cal	Estanque almacenamiento lechada de cal 160-TK-7110.	
Cordillera	1601	0	1	160101	.	M	00	1	160101.M001	160101.M001E	Equipos mecánicos nuevas instalaciones en Planta de Cal	Bombas impulsión lechada cal 160-PP-7111/7112, agitador estanque 160-AG-7110, bomba sumidero 160-PP-3060.	
Cordillera	1601	0	1	160101	.	P	00	1	160101.P001	160101.P001E	Piping nuevas instalaciones en Planta de Cal	Cañerías Aboveground y ducha de ojos 160-ES-7101.	
Cordillera	1601	0	1	160101	.	J	00	1	160101.J001	160101.J001E	Instrumentos nuevas instalaciones en Planta de Cal	Válvulas de control, transmisores indicadores de nivel, manómetros, transmisores de presión u otros instrumentos para nuevas instalaciones de Cal.	
Cordillera	1601	0	1	160101	.	E	00	1	160101.E001	160101.E001E	Equipos eléctricos nuevas instalaciones en Planta de Cal	Tablero, Centro de control de motores, botoneras, enchufes u otros equipos eléctricos en nuevas instalaciones de Cal.	
Cordillera	1601	0	1	160101	.	EW	00	1	160101.EW001	160101.EW001E	Cableado nuevas instalaciones en Planta de Cal	Cableado eléctrico e instrumentación nuevas instalaciones en Planta de Cal.	
Cordillera	1601	0	1	160101	.	T	00	1	160101.T001	160101.T001E	Canalizaciones nuevas instalaciones en Planta de Cal	Canalizaciones de cableados para nuevas instalaciones de Cal.	

					COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI					VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS			
					Diccionario AWP								
N° CMDIC					FECHA EMISIÓN		REVISIÓN			RESPONSABLES		PÁGINA	N° BECHTEL
333-PRC23084-000-50-EL-5001					18-mar-26		1			Generado: FSV Revisado: MGR Aprobado: PSD		13 de 21	26610-225-G27-GCX-50001
Construction Work Packages (CWP)													
Contrato	CWA	Correlativo CV	CV_V	CV	Separador	Disciplina	Correlativo CWP 1	Correlativo CWP 2	CWP	EWP	Nombre CWP / EWP	Descripción de alcance, elementos y equipos del CWP / EWP	
Cordillera	1601	0	1	160101	.	F	00	1	160101.F001	160101.F001E	Malla a tierra y pararrayos nuevas instalaciones en Planta de Cal	Construcción y/o conexión a malla puesta tierra existentes nuevas instalaciones de Cal. Incluye instalación de pararrayos.	
Cordillera	1601	0	1	160101	.	F	00	2	160101.F002	160101.F002E	Alumbrado nuevas instalaciones en Planta de Cal	Instalación de luminarias y postes de alumbrado en nuevas instalaciones de Cal.	
Cordillera	1601	0	1	160101	.	FF	00	1	160101.FF001	160101.FF001E	Red de incendios nuevas instalaciones en Planta de Cal	Red de incendios Aboveground y Underground nuevas instalaciones en Planta de Cal.	
Cordillera	1631	0	1	163101	.	M	00	1	163101.M001	163101.M001E	Equipos mecánicos distribución de reactivos	Bombas frother diesel oil 163-PP1088 y 1089.	
Cordillera	1631	0	1	163101	.	D	00	1	163101.D001	163101.D001E	Hormigones distribución de reactivos	Hormigones y demolición de hormigón para fundaciones bombas de distribución de reactivos.	
Cordillera	1631	0	1	163101	.	P	00	1	163101.P001	163101.P001E	Piping distribución de reactivos	Cañerías para distribución de reactivos.	
Cordillera	1631	0	1	163101	.	J	00	1	163101.J001	163101.J001E	Instrumentos distribución de reactivos	Válvulas de control, transmisores indicadores de nivel, manómetros, indicador de segmentos múltiples u otros instrumentos para distribución de reactivo.	
Cordillera	1631	0	1	163101	.	EW	00	1	163101.EW001	163101.EW001E	Cableado distribución de reactivos	Cableado eléctrico e instrumentación distribución de reactivos.	
Cordillera	1631	0	1	163101	.	T	00	1	163101.T001	163101.T001E	Canalizaciones distribución de reactivos	Canalizaciones de cableados para nuevas bombas de distribución de reactivos.	
Puerto	3121	0	1	312101	.	C	00	1	312101.C001	312101.C001E	Obras Civiles sector espesador	Movimientos de tierra masivos y estructurales para fundaciones del espesador, estructura de soporte cajón distribuidor y estanques 312-TK-2001/2002.	
Puerto	3121	0	1	312101	.	D	00	1	312101.D001	312101.D001E	Hormigones sector espesador	Hormigón de emplantillado, hormigón estructural, insertos y pernos de anclaje sector espesador, estructura cajón distribuidor 312-DI-2001 y estanques 312-TK-2001/2002.	
Puerto	3121	0	1	312101	.	X	00	1	312101.X001	312101.X001E	Demoliciones de hormigón sector espesador y maxisacos	Demolición de hormigones galpón maxisacos.	
Puerto	3121	0	1	312101	.	S	00	1	312101.S001	312101.S001E	Estructura sector espesador	Estructura y retiro de estructuras sector espesador y maxisacos. Incluye estructura para cajón distribuidor 312-DI-2001. Incluye soportes de cañerías >3".	
Puerto	3121	0	1	312101	.	MB	00	1	312101.MB001	312101.MB001E	Calderería sector espesador	Cajón distribuidor concentrado 312-DI-2001/2002/2003, canaleta 312-LA-2001, estanque distribución planta existente 312-TK-2001, estanque agua recuperada 312-TK-2002.	
Puerto	3121	0	1	312101	.	M	00	1	312101.M001	312101.M001E	Equipos mecánicos sector espesador	Espesador concentrado 312-TK-2005/312-TM-2001, agitador estanque concentrado colectivo 312-AG-2001, bombas descarga espesador 312-PP-2011/2012, bombas planta existente 312-PP-2003/2004, bombas espesador concentrado 312-PP-2001/2002, bomba agua recuperada 312-PP-2005/2006, tecles 312-CH-2001/2002/2003, bomba sumidero 312-PP-2015, bombas de alimentación planta de moly existente 312-PP-1504/1505, muestreador metalúrgico 312-SA-2001, bombas booster agua sello 700-PP-2030/2031 y bombas de alimentación concentrado colectivo 323-PP-0201/0202.	
Puerto	3121	0	1	312101	.	P	00	1	312101.P001	312101.P001E	Piping sector espesador	Cañerías Aboveground sector espesador, estructura de soporte cajón distribuidor y estanques.	
Puerto	3121	0	1	312101	.	J	00	1	312101.J001	312101.J001E	Instrumentos sector espesador	Válvulas de control y dardo, transmisores (de flujo, nivel, presión, indicador), sensores de densidad y flujo, sistema CCTV, paneles y gabinetes, flujómetro u otros instrumentos que permitan el funcionamiento del espesador, del cajón distribuidor y de los estanques del área.	
Puerto	3121	0	1	312101	.	E	00	1	312101.E001	312101.E001E	Equipos eléctricos sector espesador	Variador de frecuencia, botonera, switch u otros equipos eléctricos sector espesador, cajón distribuidor y estanques.	
Puerto	3121	0	1	312101	.	EW	00	1	312101.EW001	312101.EW001E	Cableado sector espesador	Cableado eléctrico e instrumentación sector espesador, cajón distribuidor y estanques.	

					COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI					VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS				
					Diccionario AWP									
N° CMDIC					FECHA EMISIÓN		REVISIÓN			RESPONSABLES		PÁGINA	N° BECHTEL	
333-PRC23084-000-50-EL-5001					18-mar-26		1			Generado: FSV Revisado: MGR Aprobado: PSD		14 de 21	26610-225-G27-GCX-50001	
Construction Work Packages (CWP)														
Contrato	CWA	Correlativo CV	CV_V	CV	Separador	Disciplina	Correlativo CWP 1	Correlativo CWP 2	CWP	EWP	Nombre CWP / EWP	Descripción de alcance, elementos y equipos del CWP / EWP		
Puerto	3121	0	1	312101	.	T	00	1	312101.T001	312101.T001E	Canalizaciones sector espesador	Canalizaciones sector espesador, cajón distribuidor y estanques.		
Puerto	3121	0	1	312101	.	F	00	1	312101.F001	312101.F001E	Malla a tierra sector espesador	Construcción malla puesta tierra sector espesador, cajón distribuidor y estanques.		
Puerto	3121	0	1	312101	.	F	00	2	312101.F002	312101.F002E	Alumbrado sector espesador	Instalación luminarias y postes de alumbrado en instalaciones del nuevo espesador 312-TK-2005.		
Puerto	3121	0	1	312101	.	FF	00	1	312101.FF001	312101.FF001E	Red de incendio sector espesador	Red de incendio Aboveground y Underground sector espesador, cajón distribuidor y estanques del área.		
Puerto	3221	0	1	322101	.	C	00	1	322101.C001	322101.C001E	Obras Civiles extensión Stockpile y caminos	Excavaciones y rellenos masivos o estructurales para la extensión del Edificio de Acopio N°2. Incluye la conformación y/o modificación de caminos. Incluye montaje de cortina temporal eje 12 para evitar emanación de partículas incandescente.		
Puerto	3221	0	1	322101	.	D	00	1	322101.D001	322101.D001E	Hormigones extensión Stockpile	Hormigón de emplantillado, hormigón estructural, armaduras y pernos de anclaje para extensión de Stockpile.		
Puerto	3221	0	1	322101	.	X	00	1	322101.X001	322101.X001E	Demoliciones de hormigón extensión Stockpile	Demolición de hormigones para extensión Stockpile.		
Puerto	3221	0	1	322101	.	S	00	1	322101.S001	322101.S001E	Estructura extensión Stockpile	Montaje de estructura extensión edificio y desmantelamiento de estructura edificio existente.		
Puerto	3221	0	1	322101	.	A	00	1	322101.A001	322101.A001E	Arquitectura extensión Stockpile	Montaje de revestimiento extensión edificio y retiro de revestimiento edificio existente.		
Puerto	3221	0	1	322101	.	M	00	1	322101.M001	322101.M001E	Equipos mecánicos extensión Stockpile	Extensión correas 322-CV-3301 y 322-CV-3303, extensión puente grúa 322-CN-3301, ventilador 322-FA-8001, colector de polvo 322-DC-8001, válvula rotatoria 322-DC-8001-1, extractor de aire 322-DC-8001-2 y transportador tornillo 322-DC-8001-3.		
Puerto	3221	0	1	322101	.	MB	00	1	322101.MB001	322101.MB001E	Calderería extensión Stockpile	Tolva carguío 322-ST-3301, ducto ventilación 322-DU-3302.		
Puerto	3221	0	1	322101	.	E	00	1	322101.E001	322101.E001E	Equipos eléctricos extensión Stockpile	Centro control de motores 322-MC-801, tableros u otros equipos eléctricos para la operatividad de la extensión del Edificio.		
Puerto	3221	0	1	322101	.	J	00	1	322101.J001	322101.J001E	Instrumentos extensión Stockpile	Pullcords, sensores desalineamiento u otros instrumentos para la operatividad de la extensión del Edificio.		
Puerto	3221	0	1	322101	.	EW	00	1	322101.EW001	322101.EW001E	Cableado extensión Stockpile	Cableado eléctrico e instrumentación extensión Stockpile.		
Puerto	3221	0	1	322101	.	T	00	1	322101.T001	322101.T001E	Canalizaciones extensión Stockpile	Canalizaciones desde equipos instalados en extensión a Stockpile hasta sala eléctrica existente 322-ER-001.		
Puerto	3221	0	1	322101	.	F	00	1	322101.F001	322101.F001E	Malla a tierra y pararrayos extensión Stockpile	Construcción y/o conexión a malla puesta tierra existente extensión Stockpile.		
Puerto	3221	0	1	322101	.	F	00	2	322101.F002	322101.F002E	Alumbrado extensión Stockpile	Instalación de luminarias y postes de alumbrado para extensión de plataforma y del Edificio.		
Puerto	3221	0	1	322101	.	P	00	1	322101.P001	322101.P001E	Piping extensión Stockpile	Líneas de Aire de instrumentación.		
Puerto	3221	0	1	322101	.	FF	00	1	322101.FF001	322101.FF001E	Red de incendio extensión Stockpile	Red de incendio Aboveground y Underground extensión Stockpile.		
Puerto	7101	0	1	710101	.	C	00	1	710101.C001	710101.C001E	Obras Civiles sector sala eléctrica 700-ER-705 y caminos	Movimientos de tierra masivos y estructurales del área. Incluye movimientos de tierra para bancos de ductos asociados a la sala eléctrica, subestación unitaria y generador. Incluye movimientos de tierra para fundaciones de torres para conexión 23kV a sala existente 3725-ER-003.		

					COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI					VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS				
					Diccionario AWP									
N° CMDIC					FECHA EMISIÓN		REVISIÓN			RESPONSABLES		PÁGINA	N° BECHTEL	
333-PRC23084-000-50-EL-5001					18-mar-26		1			Generado: FSV Revisado: MGR Aprobado: PSD		15 de 21	26610-225-G27-GCX-50001	
Construction Work Packages (CWP)														
Contrato	CWA	Correlativo CV	CV_V	CV	Separador	Disciplina	Correlativo CWP 1	Correlativo CWP 2	CWP	EWP	Nombre CWP / EWP	Descripción de alcance, elementos y equipos del CWP / EWP		
Puerto	7101	0	1	710101	.	D	00	1	710101.D001	710101.D001E	Hormigones sector sala eléctrica 700-ER-705	Hormigón de emplantillado, estructural y pernos de anclaje para sala eléctrica, transformador y generador. Incluye hormigones para bancos de ductos, sala eléctrica, subestación unitaria y generador. Incluye hormigones para fundaciones de torres para conexión 23kV a sala existente 3725-ER-003.		
Puerto	7101	0	1	710101	.	S	00	1	710101.S001	710101.S001E	Estructuras sector sala eléctrica 700-ER-705	Instalación de torres eléctricas para conexión 23kV de subestación 700-US-713 a sala existente 3725-ER-003.		
Puerto	7101	0	1	710101	.	ER	00	1	710101.ER001	710101.ER001E	Módulo de Sala eléctrica 700-ER-705	Instalación de módulos para extensión de sala eléctrica 700-ER-705. Incluye toda la estructura y arquitectura de la sala.		
Puerto	7101	0	1	710101	.	E	00	1	710101.E001	710101.E001E	Equipos eléctricos sector sala eléctrica 700-ER-705	Subestación 700-US-713, generador 700-DG-702, equipos interior sala, equipos de aire acondicionado, tableros, transformadores u otros equipos eléctricos asociados a la instalación de la sala eléctrica.		
Puerto	7101	0	1	710101	.	EW	00	1	710101.EW001	710101.EW001E	Cableado sector sala eléctrica 700-ER-705	Cableado eléctrico e instrumentación sector sala eléctrica 700-ER-705.		
Puerto	7101	0	1	710101	.	J	00	1	710101.J001	710101.J001E	Instrumentos sector sala eléctrica 700-ER-705	Válvula de control, manómetro, transmisor de presión, analizador de ph, flujómetro, transmisor de nivel, indicador de nivel u otros instrumentos a instalar en la sala eléctrica 700-ER-705.		
Puerto	7101	0	1	710101	.	T	00	1	710101.T001	710101.T001E	Canalizaciones sector sala eléctrica 700-ER-705	Canalizaciones sala eléctrica 700-ER-705 hacia piperacks.		
Puerto	7101	0	1	710101	.	F	00	1	710101.F001	710101.F001E	Malla a tierra y pararrayos sector sala eléctrica 700-ER-705	Construcción y/o conexión a malla puesta tierra existente sector sala eléctrica 700-ER-705		
Puerto	7101	0	1	710101	.	F	00	2	710101.F002	710101.F002E	Alumbrado sector sala eléctrica 700-ER-705	Instalación luminarias y postes de alumbrado en nueva sala eléctrica y su plataforma.		
Puerto	7101	0	2	710102	.	EW	00	1	710102.EW001	710102.EW001E	Cableado Edificio Persenk	Cableado hacia Edificio Persenk para integración al Sistema de Control de la planta.		
Puerto	7101	0	2	710102	.	J	00	1	710102.J001	710102.J001E	Instrumentos Edificio Persenk	Equipos de instrumentación para integración al Sistema de Control.		
Puerto	7101	0	2	710102	.	T	00	1	710102.T001	710102.T001E	Canalizaciones Edificio Persenk	Canalizaciones para cables tendidos hacia Edificio Persenk para integración al Sistema de Control.		
Puerto	7101	0	3	710103	.	D	00	1	710103.D001	710103.D001E	Hormigones estanque reprocesamiento de colas 710-TK-2016	Homigones para fundaciones de estanque 710-TK-2016 y para bombas 710-PP-2119 y 710-PP-2120.		
Puerto	7101	0	3	710103	.	MB	00	1	710103.MB001	710103.MB001E	Calderería estanque reprocesamiento de colas 710-TK-2016	Estanque de colas primera limpieza 710-TK-2016, cajón rebose 710-ST-2005.		
Puerto	7101	0	3	710103	.	M	00	1	710103.M001	710103.M001E	Equipos mecánicos estanque reprocesamiento de colas 710-TK-2016	Bombas 710-PP-2119/2120, tecles 710-CH-2007/2008.		
Puerto	7101	0	3	710103	.	E	00	1	710103.E001	710103.E001E	Equipos eléctricos estanque reprocesamiento de colas 710-TK-2016	Equipos eléctricos asociados al funcionamiento del estanque de reprocesamiento de colas 710-TK-2016.		
Puerto	7101	0	3	710103	.	J	00	1	710103.J001	710103.J001E	Instrumentos estanque reprocesamiento de colas 710-TK-2016	Instrumentos para estanque de reprocesamiento de colas, bombas y tecles.		
Puerto	7101	0	3	710103	.	EW	00	1	710103.EW001	710103.EW001E	Cableado sector estanque reprocesamiento de colas 710-TK-2016	Cableado para equipos del estanque de colas 710-TK-2016.		
Puerto	7101	0	3	710103	.	P	00	1	710103.P001	710103.P001E	Piping estanque reprocesamiento de colas 710-TK-2016	Cañerías alimentación y descarga del estanque de reprocesamiento de colas 710-TK-2016.		
Puerto	7101	0	3	710103	.	T	00	1	710103.T001	710103.T001E	Canalizaciones sector estanque reprocesamiento de colas 710-TK-2016	Canalizaciones estanque de colas 710-TK-2016.		
Puerto	7101	0	3	710103	.	S	00	1	710103.S001	710103.S001E	Estructuras de acero estanque de reprocesamiento de colas 710-TK-2016	Instalación y modificación de estructuras para instalación y mantención del estanque de reprocesamiento de colas.		

					COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI					VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS				
					Diccionario AWP									
N° CMDIC					FECHA EMISIÓN		REVISIÓN			RESPONSABLES		PÁGINA	N° BECHTEL	
333-PRC23084-000-50-EL-5001					18-mar-26		1			Generado: FSV Revisado: MGR Aprobado: PSD		16 de 21	26610-225-G27-GCX-50001	
Construction Work Packages (CWP)														
Contrato	CWA	Correlativo CV	CV_V	CV	Separador	Disciplina	Correlativo CWP 1	Correlativo CWP 2	CWP	EWP	Nombre CWP / EWP	Descripción de alcance, elementos y equipos del CWP / EWP		
Puerto	7101	0	4	710104	.	C	00	1	710104.C001	710104.C001E	Obras Civiles para Piperacks Puerto	Movimientos de tierra para fundaciones de piperacks.		
Puerto	7101	0	4	710104	.	D	00	1	710104.D001	710104.D001E	Hormigones para Piperacks Puerto	Hormigón para fundaciones piperacks del área Puerto.		
Puerto	7101	0	4	710104	.	S	00	1	710104.S001	710104.S001E	Estructura para Piperacks Puerto	Estructura de piperacks del área Puerto.		
Puerto	7101	0	4	710104	.	P	00	1	710104.P001	710104.P001E	Piping para Piperacks Puerto	Cañerías de servicios sobre piperacks del área Puerto.		
Puerto	7101	0	4	710104	.	EW	00	1	710104.EW001	710104.EW001E	Cableado para Piperacks Puerto	Cableado eléctrico e instrumentación sobre piperacks.		
Puerto	7101	0	4	710104	.	T	00	1	710104.T001	710104.T001E	Canalizaciones para Piperacks Puerto	Canalizaciones sobre piperacks.		
Puerto	7201	0	1	720101	.	MB	00	1	720101.MB001	720101.MB001E	Calderería sector estanque de acidulado	Estanque acidulado 720-TK-2001.		
Puerto	7201	0	1	720101	.	M	00	1	720101.M001	720101.M001E	Equipos mecánicos sector estanque de acidulado	Agitador estanque acidulado 720-AG-2001, bombas alimentación estanque acidulado 720-PP-2001/2002, bomba sumidero estanque acidulado 720-PP-2010, bombas dosificadoras de ácido sulfúrico 720-PP-2101/2118, bombas dosificadoras de soda cáustica 720-PP-2121/2122.		
Puerto	7201	0	1	720101	.	P	00	1	720101.P001	720101.P001E	Piping sector estanque de acidulado	Cañerías Aboveground sector estanques de acidulado para líneas de agua, procesos, reactivos y concentrado. Incluye duchas lavado de ojos 720-ES-2001/2002		
Puerto	7201	0	1	720101	.	C	00	1	720101.C001	720101.C001E	Obras Civiles sector estanque de acidulado y acondicionado	Movimientos de tierra masivos y estructurales para fundaciones de estanques de acidulado y acondicionado.		
Puerto	7201	0	1	720101	.	D	00	1	720101.D001	720101.D001E	Hormigones sector estanque de acidulado y acondicionado	Hormigón de emplantillado, hormigón estructural, y armaduras para estanques de acidulado y acondicionado. Incluye pernos de anclaje e insertos para estanque de acidulado.		
Puerto	7201	0	1	720101	.	S	00	1	720101.S001	720101.S001E	Estructura sector estanque de acidulado	Estructura plataforma de acceso a estanque de acidulado, bombas, válvulas y tableros del sector. Incluye soportes de cañerías >3".		
Puerto	7201	0	1	720101	.	E	00	1	720101.E001	720101.E001E	Equipos eléctricos sector estanque de acidulado	Equipos eléctricos sector estanque de acidulado.		
Puerto	7201	0	1	720101	.	J	00	1	720101.J001	720101.J001E	Instrumentos sector estanque de acidulado	Instrumentos para estanque de acidulado.		
Puerto	7201	0	1	720101	.	EW	00	1	720101.EW001	720101.EW001E	Cableado sector estanque de acidulado	Cableado eléctrico e instrumentación para estanque de acidulado.		
Puerto	7201	0	1	720101	.	F	00	1	720101.F001	720101.F001E	Malla a tierra sector estanque de acidulado	Construcción y/o conexión a malla puesta tierra existente sector estanque de acidulado.		
Puerto	7201	0	1	720101	.	F	00	2	720101.F002	720101.F002E	Alumbrado sector estanque de acidulado	Instalación luminarias sector estanque de acidulado.		
Puerto	7201	0	1	720101	.	T	00	1	720101.T001	720101.T001E	Canalizaciones sector estanque de acidulado	Canalizaciones estanque de acidulado.		
Cordillera	5301	0	1	530101	.	C	00	1	530101.C001	530101.C001E	Obras Civiles Reservorio de agua fresca	Movimientos de tierra para Reservorio de agua fresca, movimientos de tierra para piping, canalizaciones, cruzada de camino. Incluye instalación de geotextil, geomembranas y geonet.		
Cordillera	5301	0	1	530101	.	D	00	1	530101.D001	530101.D001E	Hormigones Reservorio de agua fresca	Hormigón de emplantillado, hormigón estructural, armaduras, insertos y pernos de anclaje.		
Cordillera	5301	0	1	530101	.	S	00	1	530101.S001	530101.S001E	Estructura Reservorio de agua fresca	Cerco perimetral para Reservorio. Incluye soportes de cañerías >3".		

					COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI						VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS					
					Diccionario AWP											
N° CMDIC					FECHA EMISIÓN		REVISIÓN			RESPONSABLES			PÁGINA		N° BECHTEL	
333-PRC23084-000-50-EL-5001					18-mar-26		1			Generado: FSV Revisado: MGR Aprobado: PSD			17 de 21		26610-225-G27-GCX-50001	
Construction Work Packages (CWP)																
Contrato	CWA	Correlativo CV	CV_V	CV	Separador	Disciplina	Correlativo CWP 1	Correlativo CWP 2	CWP	EWP	Nombre CWP / EWP			Descripción de alcance, elementos y equipos del CWP / EWP		
Cordillera	5301	0	1	530101	.	J	00	1	530101.J001	530101.J001E	Instrumentos Reservorio de agua fresca			Válvulas, Medición de nivel, paneles, tableros, cajas de conexión u otros instrumentos para el nuevo Reservorio de agua fresca.		
Cordillera	5301	0	1	530101	.	P	00	1	530101.P001	530101.P001E	Piping Reservorio de agua fresca			Cañerías Aboveground Reservorio de agua fresca.		
Cordillera	5301	0	1	530101	.	U	00	1	530101.U001	530101.U001E	Piping Reservorio de agua fresca			Cañerías Underground Reservorio de agua fresca.		
Cordillera	5301	0	1	530101	.	E	00	1	530101.E001	530101.E001E	Equipos eléctricos Reservorio de agua fresca			Columna de CCM BT y Tablero con dos partidores Nema 2 u otros equipos eléctricos para el funcionamiento del nuevo Reservorio.		
Cordillera	5301	0	1	530101	.	EW	00	1	530101.EW001	530101.EW001E	Cableado Reservorio de agua fresca			Cableado eléctrico e instrumentación Reservorio de agua fresca.		
Cordillera	5301	0	1	530101	.	T	00	1	530101.T001	530101.T001E	Canalizaciones Reservorio de agua fresca			Canalizaciones nuevo Reservorio.		
Cordillera	5301	0	1	530101	.	F	00	1	530101.F001	530101.F001E	Malla a tierra y pararrayos Reservorio de agua fresca			Construcción y/o conexión malla a tierra existente sector estanque de acidulado Reservorio de agua fresca.		
Cordillera	5301	0	1	530101	.	F	00	2	530101.F002	530101.F002E	Alumbrado Reservorio de agua fresca			Instalación luminarias y postes de alumbrado en nuevo Reservorio.		

		COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI			VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS				
		Diccionario AWP							
N° CMDIC		FECHA EMISIÓN	REVISIÓN	RESPONSABLES		PÁGINA	N° BECHTEL		
333-PRC23084-000-50-EL-5001		18-mar-26	1	Generado: FSV Revisado: MGR Aprobado: PSD		18 de 21	26610-225-G27-GCX-50001		
System Work Package (SWP)									
SWP	Nombre SWP	Sistema	Nombre Sistema	Subsistema	Nombre Subsistema	CWA	CV	CWP	EWP
312101.SU001	Holding Tanks - Puerto	323A	Holding Tanks - Puerto	0323-HSC-001	Bombas de Alimentación Planta Moly Existente	3121	312101	312101.M001	312101.M001E
				0323-HSC-002	Bombas de Alimentación Concentrado Colectivo	3121	312101	312101.J001	312101.J001E
312101.SU002	Estanque De Concentrado Colectivo 312-TK-2001	312A	Estanque De Concentrado Colectivo	0312-HSC-001	Estanque de Concentrado Colectivo 312-TK-2001	3121	312101	312101.M001	312101.M001E
						3121	312101	312101.MB001	312101.MB001E
						3121	312101	312101.J001	312101.J001E
312101.SU003	Espesador Colectivo	312B	Espesador Colectivo	0312-NSTP-001	Espesador Colectivo 312-TM-2001	3121	312101	312101.M001	312101.M001E
				312-EEC-001	Sistema CCTV Planta Moly	3121	312101	312101.MB001	312101.MB001E
				0312-HA-001	Tecles 312-CH-2001 / 2002 / 2003 (Espesador 312-TM-2001)	3121	312101	312101.J001	312101.J001E
				0312-TWR-001	Estanque de Agua Recuperada 312-TK-2002	7001	700101	700101.J001	700101.J001E
312101.SU004	Cajón Distribución y Muestreador Metalúrgico	312C	Cajon Distribución Y Muestreador Metalúrgico	0312-JA-001	Muestreador Metalúrgico de Concentrado 312-SA-2001	3121	312101	312101.M001	312101.M001E
710103.SU001	Bombeo de Colas a Cajón Distribuidor	312D	Bombeo De Colas A Cajón Distribuidor	0710-HSC-001	Bombeo de Colas Primera Limpieza	7101	710103	710103.M001	710103.M001E
				0710-HA-001	Tecles 710-CH-2007 / 2008 (Bombeo Colas Planta Moly 0710-PP-2119 / 2120)	7101	710101	710101.J001	710101.J001E
322101.SU001	Colección de Polvo Stock-Pile 2	322A	Colección De Polvo Stock-Pile 2	0322-QH-001	Colector de Polvo 322-DC-8001	3221	322101	322101.M001	322101.M001E
710101.SU002	Utilities	500A	Utilities	0322-PAS-001	Distribución Aire Planta e Instrumentación Área Puerto	3121	312101	312101.J001	312101.J001E
				0500-PAE-001	Distribución Aire Planta Área Puerto	7001	700101	700101.J001	700101.J001E
				0500-PAI-001	Distribución Aire Instrumentación Puerto	7101	710101	710101.J001	710101.J001E
				0700-WY-001	Suministro y Distribución Agua Sello Área Puerto	7201	720101	720101.J001	720101.J001E
312101.SU005	Sistema Protección Contra Incendio	600A	Sistema Protección Contra Incendio	0600-PF-001	Sistema Protección Contra Incendio Puerto	3121	312101	312101.FF001	312101.FF001E
						3221	322101	322101.FF001	322101.FF001E
						7101	710101	710101.FF001	710101.FF001E
322101.SU002	Facilities	600B	Facilities	0322-NZC-001	Edificio Stock Pile 2	-	-	-	-
				0312-NZC-001	Espesador	-	-	-	-
				0700-NZC-001	700-ER-705	-	-	-	-
710101.SU001	Sistema Distribución Eléctrico 700-ER-705	700A	Sistema Distribución Eléctrico 700-ER-705	0700-ESC-001	Sistema de Alimentación en Media Tensión (23 kV)	7101	710101	710101.E001	710101.E001E
				0700-ESB-001	Subestación Unitaria 23 kV, 700-US-713	-	-	-	-
				0700-ESA-001	Switchgear de Baja Tensión 700-SG-705	-	-	-	-
				0700-ECMH-001	Centro Control de Motores 700-MC-713 y 700-MC-714	-	-	-	-
710102.SU001	Sistema De Control DCS	700B	Sistema De Control DCS	0700-JD-001	Sistema de Control Emerson Delta V	7101	710101	710101.E001	710101.E001E
				0700-JD-002	Sistema de Control Emerson Delta V Terreno	3121	312101	312101.J001	312101.J001E
				0700-JD-003	HMI ESPESADOR 312-TK-2005 (HMI-OWS-312)	7101	710101	710101.J001	710101.J001E

		COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI			VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS				
		Diccionario AWP							
N° CMDIC		FECHA EMISIÓN	REVISIÓN	RESPONSABLES		PÁGINA	N° BECHTEL		
333-PRC23084-000-50-EL-5001		18-mar-26	1	Generado: FSV Revisado: MGR Aprobado: PSD		19 de 21	26610-225-G27-GCX-50001		
System Work Package (SWP)									
SWP	Nombre SWP	Sistema	Nombre Sistema	Subsistema	Nombre Subsistema	CWA	CV	CWP	EWP
710102.SU002	Comunicación y Redes	700C	Comunicación y Redes	0700-EWS-001	Sistema de Comunicaciones OT (Operation Technology)	7101	710101	710101.E001	710101.E001E
720101.SU001	Estanque Acidulado, Soda Cáustica, Ácido Sulfúrico y Bombas - Puerto	720A	Estanque Acidulado, Soda Cáustica, Ácido Sulfúrico y Bombas - Puerto	0720-HSC-001	Bomba Estanque Acidulado	7201	720101	720101.MB001	720101.MB001E
				0720-CC-001	Soda Cáustica	7201	720101	720101.D001	720101.D001E
				0720-QSD-001	Ducto de Aire Enrarecido	7201	720101	720101.M001	720101.M001E
				0720-CSS-001	Ácido Sulfúrico	7201	720101	720101.J001	720101.J001E
				0720-WNE-001	Ducha de Emergencia	-	-	-	-

	COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI		VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS		
	Diccionario AWP				
N° CMDIC	FECHA EMISIÓN	REVISIÓN	RESPONSABLES	PÁGINA	N° BECHTEL
333-PRC23084-000-50-EL-5001	18-mar-26	1	Generado: FSV Revisado: MGR Aprobado: PSD	20 de 21	26610-225-G27-GCX-50001

6. LISTADO DE MTO'S Y CUBICACIONES

333-PRC23084-000-43-MO-5001	26610-225-S0B-0000-50001	MTO Estructuras Metálicas
333-PRC23084-000-42-MO-5001	26610-225-D0B-0000-50001	MTO Hormigones (Incluye pernos de anclaje e insertos)
333-PRC23084-000-41-MO-5001	26610-225-C0B-0000-50001	MTO Movimiento de Tierras y Rellenos
333-PRC23084-000-44-MO-5001	26610-225-A0B-0000-50001	MTO Revestimientos (Arquitectura)
333-PRC23084-000-46-MO-7003	26610-227-P0X-0000-70003	MTO Cañerías Acero Carbono y HDPE - Ujina
333-PRC23084-000-46-MO-8003	26610-228-P0X-0000-80003	MTO Cañerías Acero Carbono y HDPE - Puerto
333-PRC23084-000-46-MO-7004	26610-227-P0X-0000-70004	MTO Misceláneos - Ujina
333-PRC23084-000-46-MO-8004	26610-228-P0X-0000-80004	MTO Misceláneos - Puerto
333-PRC23084-000-46-MO-7005	26610-227-P0X-0000-70005	MTO Soportes Ujina
333-PRC23084-000-46-MO-8005	26610-228-P0X-0000-80005	MTO Soportes Puerto
333-PRC23084-000-46-MO-7006	26610-227-P0X-0000-70006	MTO Piping a Aislar Térmicamente con o sin Cinta Calefactora
333-PRC23084-143-47-EL-7008	26610-227-E0X-0143-70008	Listado de Canalizaciones y Escalerillas Cordillera
333-PRC23084-700-47-EL-8008	26610-228-E0X-0700-80008	Listado de Canalizaciones y Escalerillas Puerto
333-PRC23084-143-47-EL-7005	26610-227-E0X-0143-70005	Listado de Circuitos Cordillera
333-PRC23084-700-47-EL-8005	26610-228-E0X-0700-80005	Listado de Circuitos Puerto
333-PRC23084-143-47-EL-7001	26610-227-E0X-0143-70001	Listado de Equipos Eléctricos Cordillera
333-PRC23084-700-47-EL-8001	26610-228-E0X-0700-80001	Listado de Equipos Eléctricos Puerto
333-PRC23084-143-47-EL-7003	26610-227-E0X-0143-70003	Listado de Motores Cordillera
333-PRC23084-700-47-EL-8003	26610-228-E0X-0700-80003	Listado de Motores Puerto
333-PRC23084-700-47-EL-8006	26610-228-E0X-0700-80006	Listado de Materiales Eléctricos Puerto
333-PRC23084-143-47-EL-7006	26610-227-E0X-0143-70006	Listado de Materiales Eléctricos Cordillera
333-PRC23084-100-48-EL-9001	26610-229-JDX-0100-90001	Listado de Instrumentos - Rosario
333-PRC23084-100-48-EL-9002	26610-229-JDX-0100-90002	Listado de Equipos de Instrumentación - Rosario
333-PRC23084-100-48-MO-9001	26610-229-POR-0100-90001	Listado MTO CSI - Rosario
333-PRC23084-100-48-EL-7002	26610-227-JDX-0100-70002	Listado de Instrumentos - Ujina
333-PRC23084-100-48-EL-7003	26610-227-JDX-0100-70003	Listado de Equipos de Instrumentación - Ujina
333-PRC23084-100-48-EL-7007	26610-227-JDX-0100-70007	Listado de Cables Ujina
333-PRC23084-100-48-MO-7001	26610-227-POR-0100-70001	Listado MTO CSI - Ujina
333-PRC23084-300-48-EL-8002	26610-228-JDX-0300-80002	Listado de Instrumentos - Puerto
333-PRC23084-300-48-EL-8003	26610-228-JDX-0300-80003	Listado de Equipos de Instrumentación - Puerto
333-PRC23084-300-48-EL-8007	26610-228-JDX-0300-80007	Listado de Cables Puerto
333-PRC23084-300-48-EL-8008	26610-228-JDX-0300-80008	Listado de Jumper de cobre PG210 - Puerto
333-PRC23084-300-48-EL-8009	26610-228-JDX-0300-80009	Listado de Jumper de fibra PG210 - Puerto
333-PRC23084-300-48-MO-8001	26610-228-POR-0300-80001	Listado MTO CSI - Puerto
333-PRC23084-100-46-EL-7001	26610-227-M6X-0100-70001	Listado de Líneas Cordillera
333-PRC23084-300-46-EL-8002	26610-228-M6X-0300-80002	Listado de Líneas Puerto
333-PRC23084-100-46-EL-7003	26610-227-M6X-0100-70003	Listado de Válvulas Cordillera
333-PRC23084-300-46-EL-8004	26610-228-M6X-0300-80004	Listado de Válvulas Puerto
333-PRC23084-100-45-EL-7008	26610-227-M0X-0100-70008	Listado de Equipos Cordillera
333-PRC23084-300-45-EL-8009	26610-228-M0X-0300-80009	Listado de Equipos Puerto

Los documentos electrónicos, una vez impresos, se consideran no controlados y pueden estar obsoletos.

Compruebe en Aconex para la revisión actual.

Confidencial. © 2025, 2026 Bechtel Chile Ltda. Todos los derechos reservados.

	COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI		VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS		
	Diccionario AWP				
N° CMDIC	FECHA EMISIÓN	REVISIÓN	RESPONSABLES	PÁGINA	N° BECHTEL
333-PRC23084-000-50-EL-5001	18-mar-26	1	Generado: FSV Revisado: MGR Aprobado: PSD	21 de 21	26610-225-G27-GCX-50001

7. LISTADO DE MR'S

333-PRC23084-000-45-MR-5002	26610-225-MRA-MHCB-50002	MRA Correas In Plant
333-PRC23084-000-45-MR-7001	26610-227-MRA-MTS0-70001	MRA Estanques Cordillera
333-PRC23084-000-45-MR-5004	26610-225-MRA-MDL0-50004	MRA Calderería
333-PRC23084-000-45-MR-8001	26610-228-MRA-MTS0-80001	MRA Estanques Puerto
333-PRC23084-000-45-MR-5006	26610-225-MRA-MFA0-50006	MRA Agitadores
333-PRC23084-136-45-MR-7007	26610-227-MRA-MHFV-70007	MRA Alimentadores Vibratorios
333-PRC23084-136-45-MR-7008	26610-227-MRA-MFSS-70008	MRA Harnero Vibratorio
333-PRC23084-000-45-MR-5009	26610-225-MRA-MPYL-50009	MRA Bombas de Pulpa
333-PRC23084-312-45-MR-8001	26610-228-MRA-MLGT-80001	MRA Espesador Concentrado Colectivo
333-PRC23084-322-45-MR-8011	26610-228-MRA-MKBB-80011	MRA Colector de Polvo Stockpile Concentrado
333-PRC23084-000-45-MR-5012	26610-225-MRA-MPGW-50012	MRA Bombas Centrífugas Horizontales (Agua)
333-PRC23084-000-45-MR-5013	26610-225-MRA-MPVE-50013	MRA Bombas Verticales de Sumidero
333-PRC23084-000-45-MR-5014	26610-225-MRA-MJKH-50014	MRA Tecles y Carros
333-PRC23084-000-48-MR-5001	26610-225-MRA-JQ00-50000	MRA Sistema Monitoreo de Condiciones
333-PRC23084-000-48-MR-5005	26610-225-MRA-EWS0-50000	MRA Fibra Óptica
333-PRC23084-000-44-MR-5002	26610-225-MRA-AD00-50001	MRA Puertas y Portones (Puerto y Cordillera)
333-PRC23084-000-43-MR-7001	26610-227-MRA-SS01-70001	MRA Acero Estructural Cordillera
333-PRC23084-000-43-MR-8001	26610-228-MRA-SS01-80001	MRA Acero Estructural Puerto
333-PRC23084-000-44-MR-5001	26610-225-MRA-ATPR-50001	MRA Revestimientos Arquitectura (Puerto y Cordillera)
TBC	26610-227-MRA-PP01-70003	MRA Cañerías y Fittings de AC - Ujina
333-PRC23084-000-46-MR-5001	26610-225-MRA-PX09-50001	MRA Fittings y Cañerías HDPE (Puerto y Cordillera)
333-PRC23084-000-46-MR-5002	26610-225-MRA-PV00-50002	MRA Válvulas Manuales, Hidrantes y Gabinetes (Puerto y Cordillera)
333-PRC23084-000-46-MR-7001	26610-227-MRA-PS02-70001	MRA Spool - Ujina
333-PRC23084-000-47-MR-8001	26610-228-MRA-AKBP-80001	MRA Sala Eléctrica - Área 720
333-PRC23084-000-47-MR-8003	26610-228-MRA-MGED-80001	MRA Generador de Emergencia
333-PRC23084-100-48-MR-7003	26610-227-MRA-JV01-70001	MRA - Válvulas Moduladas y ON-OFF Ujina
333-PRC23084-300-48-MR-8003	26610-228-MRA-JV01-80001	MRA - Válvulas Moduladas y ON-OFF Puerto
333-PRC23084-000-45-MR-5016	26610-225-MRA-AYFP-50016	MRA - Sistema contra incendios
TBC	26610-228-MRA-PP01-80004	MRA Cañerías y Fittings de AC - Puerto
333-PRC23084-000-46-MR-8001	26610-228-MRA-PS02-80001	MRA Spool - Puerto
TBC	26610-228-MRA-JD01-80001	PM DCS Emerson Delta V Puerto
TBC	26610-227-MRA-JD01-70001	PM DCS Emerson Delta V Ujina
TBC	26610-228-MRA-JQ00-80002	PM Instrumentación Puerto
TBC	26610-227-MRA-JQ00-70001	PM Instrumentación Ujina
TBC	26610-225-MRA-EEC0-50000	PM Sistema Comunicaciones Red IT y CCTV
TBC	26610-225-MRA-EF00-50000	PM Sistema Comunicaciones Red OT
TBC	26610-227-MRA-AKBP-70002	PM Equipos Salas Eléctricas Existentes
TBC	26610-227-MRA-EW00-70001	PM Cables
333-PRC23084-000-47-MR-8002	26610-228-MRA-ETP2-80001	PM Subestación Unitaria Área 720

Que falta para completar este listado?

Los documentos electrónicos, una vez impresos, se consideran no controlados y pueden estar obsoletos.

Compruebe en Aconex para la revisión actual.

Confidencial. © 2025, 2026 Bechtel Chile Ltda. Todos los derechos reservados.
